

Commission d'Evaluation et de Surveillance

Mercredi 09 Février 2022, 9h30
Visioconférence

**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
DEUX-SÈVRES



PLAN DE PRESENTATION



I. Présentation du bilan technique et financier du CTGQ
Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations

II. Proposition d'un contenu du bilan évaluatif du CTGQ et
recueil des observations

III. Calendrier et étapes d'élaboration du prochain CTGQ

Introduction



- Contrat Territorial de Gestion Quantitative Sèvre-Niortaise-Mignon 2019-2021 signé en 2019 + avenant du 05 octobre 2020, issus du Protocole d'Accord pour une agriculture durable de 2018
- Article 5 du CTGQ : bilan technique et financier annuel et bilan évaluatif en fin de contrat
- Le CTGQ a identifié 5 enjeux, déclinés en actions et objectifs:
 - Faire évoluer les pratiques agricoles (CA79)
 - Mettre en œuvre les actions en faveur de la biodiversité (CA79)
 - Construire les réserves de substitution (COOP DE L'EAU)
 - Mettre en place les actions de suivi et de contrôle (CA79)
 - Piloter, porter, animer le contrat (CA79 et COOP DE L'EAU)

Introduction



- Freins et clés de l'avancement du plan d'actions :
 - » Année COVID (ex => animations techniques collectives pénalisées)
 - » Relance du partenariat territorial (ex => lien avec les porteurs de CTMA)
 - » Besoin de promouvoir des démarches via les filières (ex => certification)
 - » Des exploitants formés qui souhaitent poursuivre le cycle de formation.

I. Présentation du bilan technique et financier du CTGO Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations



Enjeu 1

Faire évoluer les pratiques agricoles et culturelles dans le bassin versant

Action	Objectif*	Réalisations au 31/12/2021	% achèvement
Diagnostic d'exploitation	Réaliser les diagnostics des irrigants du bassin (+ engagements individuels)	<u>T1</u> : 64 diags et 55 engagements sur 64 <u>T2</u> : diagnostics amorcés	100%

Rappel:

- **Engagement individuel** = actions choisies par les exploitants parmi les thèmes « diminution de l'utilisation des PPP », « pratiques culturelles » et « biodiversité »
- Des actions aux délais de mise en œuvre variables : immédiate, maintien, 1 an etc.


* Au prorata du ratio Tranche 1 des travaux

I. Présentation du bilan technique et financier du CTGO Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations



- En parallèle des engagements individuels, la profession s'investit dans des engagements collectifs:

Faire évoluer les pratiques agricoles et culturelles dans le BV

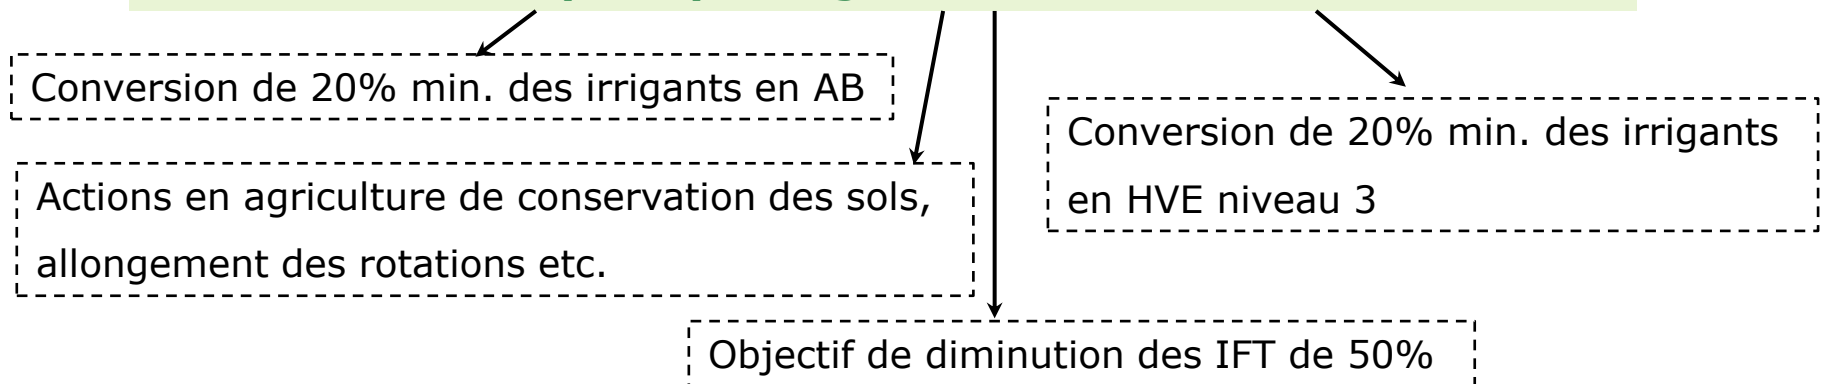

Mise en œuvre d'actions en faveur de la biodiversité

- L'ensemble des signataires a validé

I. Présentation du bilan technique et financier du CTGQ Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations



Enjeu 1

Faire évoluer les pratiques agricoles et culturelles dans le bassin versant

Action	Objectif*	Réalisations au 31/12/2021	Commentaire ou % achèvement
Formation des agriculteurs	6 sessions (3 thématiques/agri)	2 sessions, 16 agriculteurs formés en irrigation	Satisfaction ++, volonté de se former
Réduction de l'utilisation des PPP	Accompagner 12 irrigants	T1: 10 % exploitations en diminution de l'IFT, les autres réalisent des corridors écologiques, 10 % en AB/HVE	/
Améliorer le déclenchement de l'irrigation	10 sites tensio CA79 + 12 à 16 bulletins	8 sites mis en place en 2021 + 14 bulletins techniques / 17 bulletins d'étiage	80% sites 100% bulletins

* Au prorata du ratio Tranche 1 des travaux

I. Présentation du bilan technique et financier du CTGQ Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations



Enjeu 1

Faire évoluer les pratiques agricoles et culturelles dans le bassin versant

Action	Objectif*	Réalisations au 31/12/2021	Commentaire ou % achèvement
Diversification des cultures irrig./allongement des rotations	9 irrigants	18 exploitations en diversification, 39 exploitations en rotation 3 cultures sur 5 ans	100% rotation 100% diversif.
Agriculture de conservation des sols	12 exploitations avec mise en œuvre ou perfectio. soit 3000 ha	2 exploitations, 342 ha	Lien à faire avec contrat Re-sources à partir de 2022
Partenariat avec les syndicats d'eau	6 partenariats	Rapprochement fin 2021 avec les porteurs de contrats Re-sources (SERTAD, CAN et SECO), lien avec nouvelles prog.	/

* Au prorata du ratio Tranche 1 des travaux

I. Présentation du bilan technique et financier du CTGQ Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations



Enjeu 2

Mettre en œuvre les actions en faveur de la biodiversité aquatique/terr.

Action	Objectif*	Réalisations au 31/12/2021	Commentaire ou % achèvement
Plantation de haies	9 km minimum	T1: 18 km environ	100%
Réalisation de bandes fleuries/jachères	60 ha de jachère mellifère	T1: 50,9 ha	85 %
Mise en place de bandes enherbées	24 km de BE ou 40 ha avec largeur moyenne de 5 m	T1: 12,31 km	50%
Réalisations d'actions dans le cadre des CTMA	6 partenariats	Rapprochement fin 2021 du SMBVSN, IIBSN) dans le cadre du renouvellement de leurs contrats	/

* Au prorata du ratio Tranche 1 des travaux

I. Présentation du bilan technique et financier du CTGQ Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations



Enjeu 2

Mettre en œuvre les actions en faveur de la biodiversité aquatique/terr.

Action	Objectif*	Réalisations au 31/12/2021	Commentaire ou % achèvement
Participation au programme Agrifaune	2 participations	10 exploitations sur 2019-2021 dont 5 irrigants	100%
Restauration de zh et évolution de cultures en fond de vallée	2 participations	Sollicitation de l'IIBSN pour récupérer la version des IZH + rapprochement porteurs de CTMA	/
MAEC Biodiversité	150 ha de surface engagée	141,2 ha	94 %
Interculture courte ou longue au-delà de la réglementation	900 ha de surface mise en place	1004,7 ha	100 %

I. Présentation du bilan technique et financier du CTGO Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations



Enjeu 4

Mettre en œuvre les actions en faveur de la biodiversité aquatique/terr.

Action

Observatoire des pratiques agricoles et des actions en faveur de la biodiversité



Rappel des attendus du protocole d'accord


- Connaître et suivre l'évolution des éléments suivants :
 - Nature des cultures annuelles et des intrants utilisés
 - Parcelles irriguées ou non, volume utilisé par type de culture et par exploitation, origine de l'eau
 - Qualité de l'eau des captages AEP
 - Evolution des pratiques agricoles et culturelles, actions mises en œuvre en faveur de la biodiversité aquatique et terrestre
- « Le résultat de cet observatoire est présenté chaque année à la commission d'évaluation et de surveillance »
- « Il sera construit en cohérence avec les incitations du schéma directeur relatif à la préservation de la biodiversité aquatique et terrestre et permettra de l'alimenter »





Méthode d'élaboration

Etablissement public
du Marais poitevin

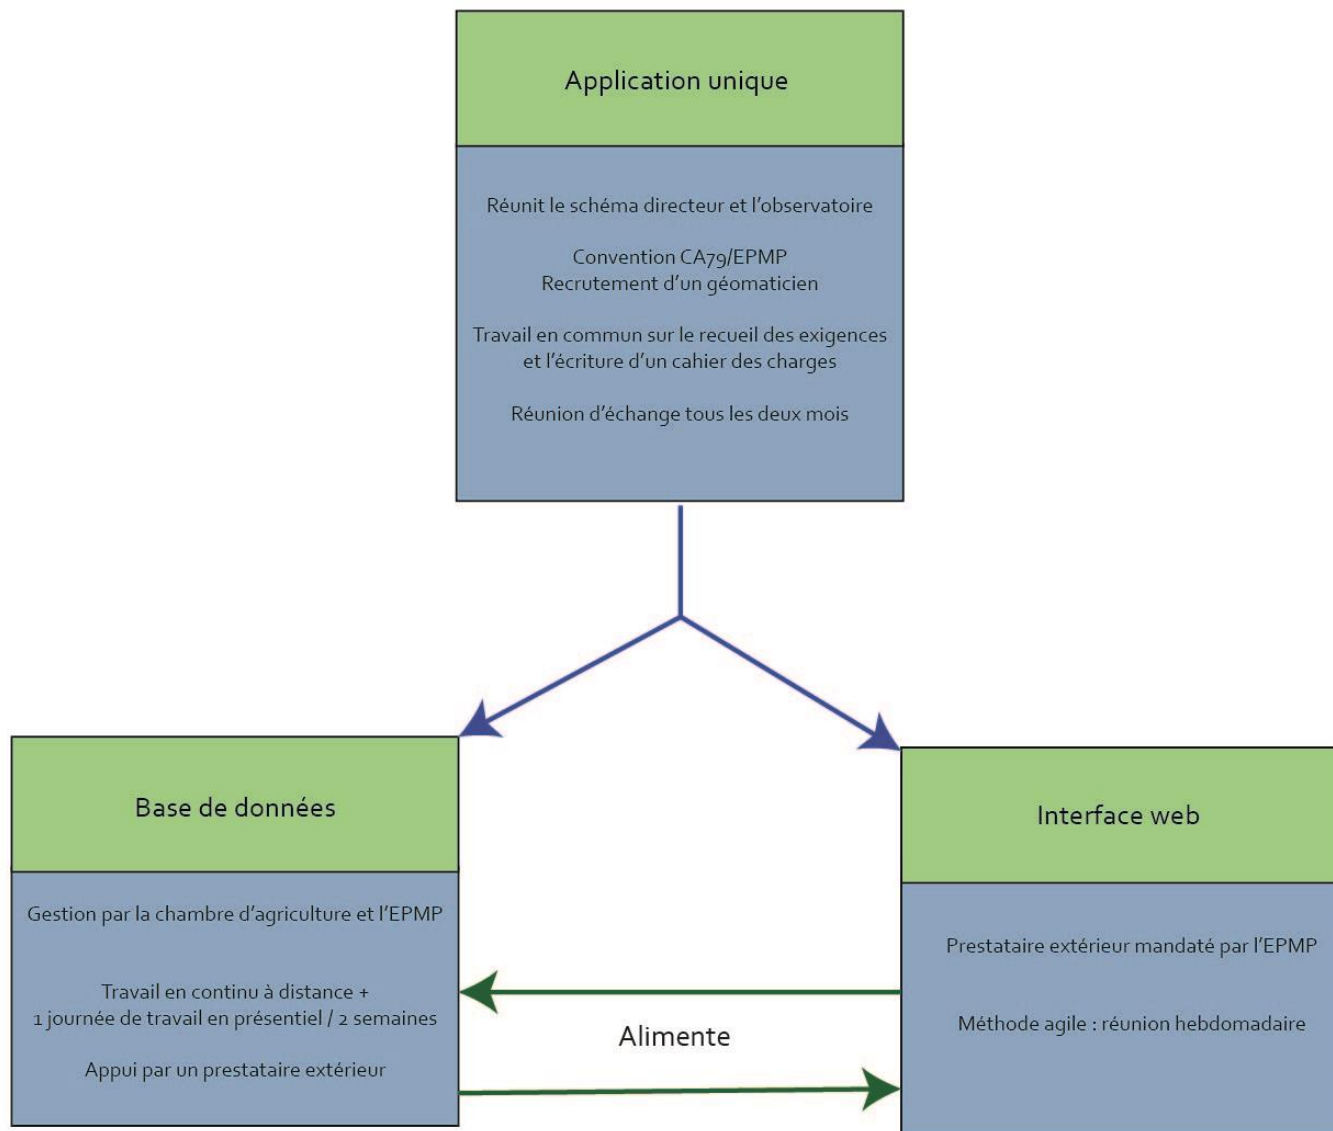



Production : Base de données

Caractéristiques :

- Gestion de la donnée intégralement depuis la base
- Base de donnée évolutive

Avancement :

- Base de données opérationnelle
- Données structurelles intégrées : exploitants, parcelles, types d'engagement, paramètres de suivi, etc.
- Automatisations





Production : Interface web

Etablissement public
du Marais poitevin



Accueil

Exploitant

Déclarant à la parcelle

Déclaration des données de suivi et des justificatifs des engagements individuels

Superviseur

Contrôle des déclarations à la parcelle

Déclaration des données de suivi et des justificatifs des engagements individuels

Public

Tableau de bord public

Inventaire Point Zéro

Schéma Directeur de la biodiversité

Synthèse des volumes consommés

Rapport à la CES

Connexion

Connectez-vous

 Identifiant ou adresse email

 Mot de passe 

Se connecter

 Tout savoir sur l'identifiant client.

[Identifiant ou mot de passe oublié ?](#)



Etablissement public
du Marais poitevin

Calendrier

V0

Prévue pour mi-février

Première présentation en réunion d'échange le 22 février

- Architecture du site
- Déclarations à la parcelle
- Pages statiques

V1

Prévue pour fin mars

- Déclaration et contrôles relatifs aux engagements
- Statistiques ouvertes au public
- Cartographies
- Rapport à la CES

V2

Prévue avant octobre

- Intégration de données supplémentaires
- Contrôles automatiques de cohérence des données
- Amélioration des possibilités d'exports (tableaux, rapports, etc.)



I. Présentation du bilan technique et financier du CTGQ Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations



Enjeu 4

Mettre en œuvre les actions en faveur de la biodiversité aquatique/terr.

Action	Objectif	Réalisations au 31/12/2021	Et après?
Schéma directeur: mesures en faveur de la biodiversité	Accompagnement des irrigants	Cartes d'orientations et d'enjeux réalisées pour Epannes, Priaires, Mauzé, St Sauvant et Ste Soline	⇒ Réunions concernant les communes périphériques prévues au premier trimestre 2022 (*25)

I. Présentation du bilan technique et financier du CTGQ Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations



Enjeu 5

Piloter, porter, animer le contrat et concerter les acteurs du territoire

Action	Objectif	Réalisations au 31/12/2021
Animation du contrat territorial (volet action) et animation générale du contrat territorial	1 bilan d'activité par an, 1 bilan technique par an, 1 COPIL par an (minimum)	1 bilan par an et au moins 1 COPIL par an
Concertation entre les acteurs du protocole	Consultation régulière via rencontres, réunions d'information, appels	Réunion maires 03/21, validation engagements collectifs 04/21, rencontre CA79/COOP/DSNE 06/21, rencontres APN été 2021, CES/CST automne 2021, groupes de travail observatoire automne 2021, point PAEC 2022 avec les animateurs, participation COPIL CTMA fin 2021
Communication générale via les réseaux et autres actions de communication	Rédaction d'articles de presse, relai page internet etc	Cpresse: 02/09, 06/10, 22/10 et 14/01/2022, note 06/11, page site CA79 avec FAQ

I. Présentation du bilan technique et financier du CTGQ Sèvre Niortaise-Mignon et recueil des observations



- Volet financier:
 - Maîtrises d’ouvrage multiples (OPA, CA79, COOP DE L’EAU, FDC, syndicats de rivière/AEP etc.)
 - Financements externes (AELB, CR, CD etc.) et autofinancement

Action	Prévisionnel (€)	Réalisé (€)
Animation CTGQ (yc matériel et prestation)	516 856	122 253
Actions enjeu 1 (MO CA79)	388 488	93 981
Diagnostics	624 240	185 000

II. Proposition d'un contenu du bilan évaluatif du CTGQ et recueil des observations



- Bilan évaluatif = phase ultime d'un projet, primordiale en amont d'un renouvellement de contrat et livrable listé dans l'article 5 du CTGQ,
- Biblio. de référence « Guide méthodologique AELB »,
- Approche de type « **réflexion collective ouverte** » organisée autour de questions axées sur l'étude globale de la dynamique projet qui va s'attacher à « **interroger la pertinence des objectifs, le choix de la stratégie, la cohérence avec d'autres interventions publiques les réalisations, les résultats territoriaux de l'action** »

II. Proposition d'un contenu du bilan évaluatif du CTGQ et recueil des observations



3 types d'approches:

- Interne
- Externe
- Accompagnement

4 grandes familles de thèmes analysés:

- Cadrage/stratégie
- Gouvernance et mise en œuvre
- Réalisations techniques/financières
- Résultats et impacts

- Voie interne choisie => orientation des livrables car animateur-évaluateur
- Thèmes proposés à l'analyse: **gouvernance, animation/partenariats, cohérence stratégie, résultats/réalisations,**

II. Proposition d'un contenu du bilan évaluatif du CTGQ et recueil des observations



Méthode proposée :

- Décliner les thèmes en sous-thèmes pour construire un questionnaire,

ANIMATION/PARTENARIATS


RESULTATS/REALISATIONS

COHERENCE STRATEGIE

GOUVERNANCE

- Envoyer le questionnaire aux membres de la CES, éventuellement compléter avec entretiens ciblés,
- Synthèse des résultats, travail sur stratégie/feuille de route et présentation en CES
- CLE de SAGE et CA de l'AELB

III. Calendrier et étapes d'élaboration du prochain CTGQ

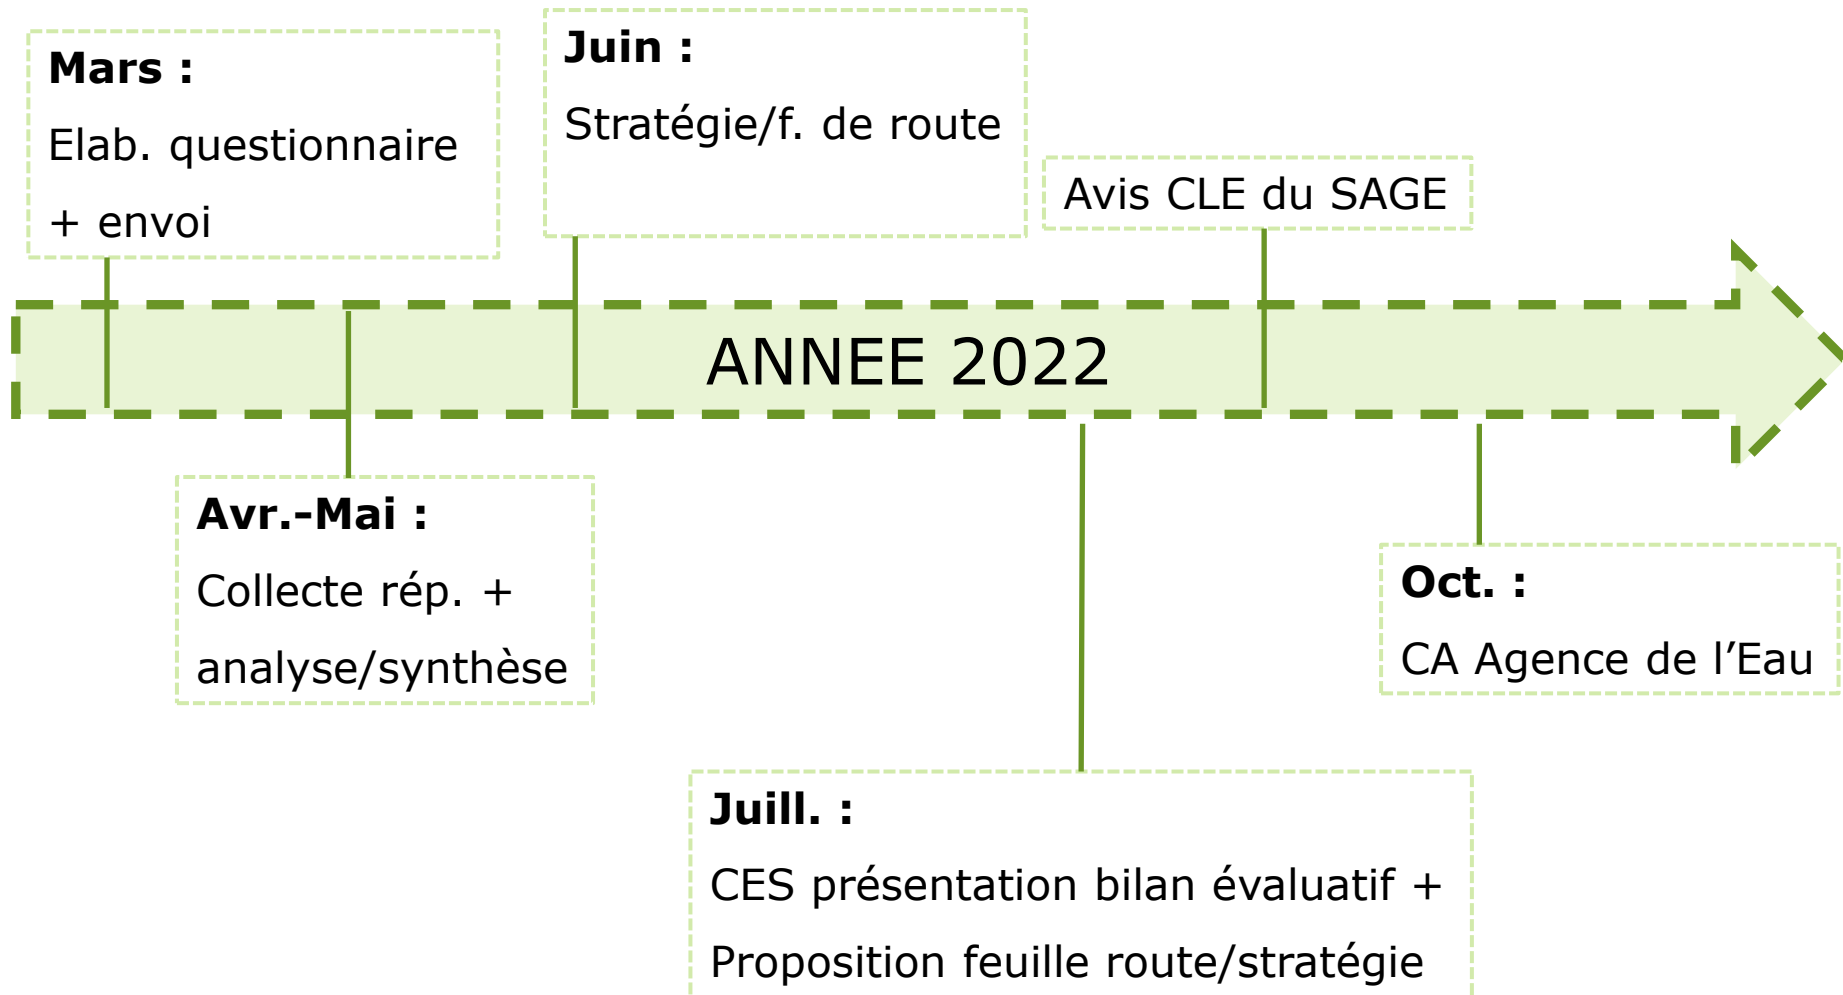

Merci de votre attention!
